



COMUNE DI CETRARO
(Provincia di Cosenza)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 31

del 17.04.2024

Oggetto: INTERVENTI URGENTI ED INDIFFERIBILI POSTI IN ESSERE PER ELIMINARE SITUAZIONI DI POSSIBILE PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ IN CONSEGUENZA DEL DANNEGGIAMENTO DELL'EMISSARIO SOTTOMARINO. APPROVAZIONE DEL VERBALE DI SOMMA URGENZA E DELLA PERIZIA GIUSTIFICATIVA DEI LAVORI.

In data odierna, dalle ore 12.00 presso la Sede Comunale a seguito di avviso del Vice Sindaco si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza dei Signori:

N°	COMPONENTI	Presente	Assente
1	Ermanno CENNAMO - Sindaco		X
2	Tommaso CESAREO - Vice Sindaco	X	
3	Barbara FALBO - Assessore	X	
4	Francesco LANZA - Assessore	X	
5	Laura LOSARDO - Assessore	X	
6	Carmen MARTILOTTA - Assessore	X	

Presiede il Vice Sindaco Tommaso CESAREO

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Dario POLICICCHIO

Il Vice Sindaco accertata la presenza del numero legale degli intervenuti, li invita a discutere e deliberare sull'argomento in oggetto.



COMUNE di CETRARO

(Provincia di Cosenza)

Ufficio Tecnico Comunale AREA VII- Settore Manutenzione e Demanio Marittimo
Codice Univoco Ufficio: 067V39, Via Luigi De Seta, 54 87022 Cetraro (CS)
Tel. 0982/978210 ufficiotecnico.cetraro@asmepec.it – lavoripubblici@asmepec.it

ALLA GIUNTA COMUNALE
SEDE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA ADOTTARE IN GIUNTA COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:

INTERVENTI URGENTI ED INDIFFERIBILI POSTI IN ESSERE PER ELIMINARE SITUAZIONI DI POSSIBILE PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ IN CONSEGUENZA DEL DANNEGGIAMENTO DELL'EMISSARIO SOTTOMARINO.

APPROVAZIONE DEL VERBALE DI SOMMA URGENZA E DELLA PERIZIA GIUSTIFICATIVA DEI LAVORI

Il Responsabile dell'Area VII,

in relazione a quanto stabilito all'art. 140 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei contratti pubblici, in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12)

PREMESSO:

- **Che l'anno 2024, il giorno 23 del mese di marzo, a seguito della tempestiva segnalazione da parte del Geom. Andrea Caruso, nella veste di amministratore unico dell'Impresa R.M.C. Costruzioni s.r.l., subappaltatrice degli "Interventi di ripristino e ricarica di opere idraulico-marittime esistenti" (finanziati con Delibera CIPESS 79 del 22 dicembre 2021 "Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 e 2021-2027"), affidati dal Comune di Cetraro (CS) all'Impresa CAMPANIA NOLEGGI S.r.l. con contratto di appalto del 17/05/2023 (Rep. 5/2023, registrato all'Agenzia delle Entrate Serie 1T, Numero: 9621 del 25/05/2023), nel corso dell'esecuzione dei lavori di salpamento di massi in cls (così come previsti nel progetto dei lavori sopra indicati), è stata accidentalmente danneggiata, dall'escavatore in uso, la condotta sottomarina di scarico nel Mar Tirreno dei reflui urbani derivanti dagli impianti di depurazione comunale;**
- **Che l'emissario sottomarino posto teoricamente (dagli elaborati grafici di progetto depositati agli atti d'ufficio) più a sud, rispetto alla scogliera preesistente ed ai massi da salpare, ovvero ad una batimetrica di circa 3,0 metri e ad una ulteriore profondità di circa 1,5 metri dal fondale marino (in tutto a - 4,5 metri), è stato, invece, 'squarciato', per una ampiezza di 1,80 metri, ad una profondità di circa 2,50 m, quindi ad una profondità significativamente minore;**

PRESO ATTO che la condotta sottomarina è stata, oltremodo, rinvenuta al di sotto di una serie di massi in calcestruzzo: detta circostanza del tutto imprevista ed imprevedibile, è da ricercarsi verosimilmente, dall'evolversi dell'erosione costiera, causata dalle violente mareggiate verificatesi dopo la realizzazione della condotta (avvenuta nel 1982);

CONSIDERATO che durante l'intervento di riparazione del suddetto tratto di condotta, a cura della Impresa Esecutrice di cui sopra, l'operatore subacqueo all'uopo incaricato ha opportunamente segnalato come la condotta sottomarina oltre che tranciata, nel punto sopra indicato, risulta estremamente schiacciata e lesionata longitudinalmente per un altro tratto distante verso mare circa 5,00 metri (rispetto al punto dello squarcio iniziale);

SPECIFICATO come in data 23.03.2024, per quanto sopra appena esposto e considerato, l'Ing. Giuseppe Curcio e l'Ing. Francesco Antonuccio hanno accertato quanto segue:

- *la lunghezza complessiva del tratto di tubazione da sostituire è di circa 13/14 metri;*

- *occorrono, pertanto, almeno un'altra barra di tubazione da 5,0 metri ed un manicotto elettrico da saldare per elettrofusione (a vantaggio di sicurezza si dovrà ordinare un'altra barra di tubo da 5 m ed almeno un altro manicotto elettrico);*
- *per l'intervento sull'estremità lato mare, per fornire adeguata assistenza ai sommozzatori, è necessario realizzare un pennello di servizio di almeno 6/8 meri dal quale poter operare con l'escavatore;*

RITENUTO, pertanto, che, non intervenendo tempestivamente per la risoluzione della problematica sopra evidenziata, si sarebbero potute verificare copiose uscite di reflui in corrispondenza dell'impianto di sollevamento, denominato '*spinta a mare*', sito in Località Sottocastello – Cubo;

RICHIAMATO l'art. 140 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in cui, al comma 6, si ribadisce che "*Costituisce circostanza di somma urgenza, ai fini del presente articolo, anche il verificarsi degli eventi di cui all'articolo 7 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, ovvero la ragionevole previsione dell'imminente verificarsi degli stessi, che richiede l'adozione di misure indilazionabili, nei limiti dello stretto necessario*";

VISTO il "*Verbale di Somma Urgenza*", redatto in data 23/03/2024, con il quale, indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, è stata disposta, in capo alla Impresa CAMPANIA NOLEGGI S.r.l., l'immediata esecuzione, condizioni meteomarine favorevoli, dei lavori / interventi strettamente necessari al ripristino della funzionalità idraulica della condotta sottomarina;

PRECISATO che nello stesso "*Verbale di Somma Urgenza*" si è stabilito di demandare, per vie brevi e senza alcun costo, all'Ing. Gianfranco Sbarra il compito di vigilare sulla corretta esecuzione dei lavori di che trattasi, ovvero sia di approntare una contabilità separata tra i lavori la cui spesa sarà a carico del Comune ed i lavori da spesare, con la voce '*imprevisti*', nell'ambito del finanziamento regionale sopra indicato;

DATO ATTO che, ai sensi del comma 3 dell'anzidetto art. 140 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, "*Il corrispettivo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo il RUP può ingiungere all'affidatario l'esecuzione di forniture, servizi o lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzi ufficiali di riferimento, ridotti del 20 per cento. I prezzi di cui al primo periodo, se relativi all'esecuzione di lavori, sono comunque ammessi nella contabilità e, se relativi all'acquisizione di forniture e servizi, sono allegati al verbale e sottoscritti dall'operatore economico; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati*";

VISTO che, ai sensi del comma 4 dell'anzidetto art. 140 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, "*Il RUP o altro tecnico dell'amministrazione competente compila una perizia giustificativa delle prestazioni richieste entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione della prestazione affidata. Qualora l'amministrazione competente sia un ente locale, la copertura della spesa è assicurata con le modalità previste dagli articoli 191, comma 3, e 194 comma 1, lettera e), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*";

VISTA la "*Perizia Giustificativa dei Lavori*", redatta dall'Ing. Gianfranco Sbarra sotto forma di contabilità, in cui, oltre alla esatta individuazione dei lavori e degli interventi complementari che sono stati eseguiti per risolvere la criticità in argomento, è stata quantificata in complessivi **€uro 5.294,80** (I.V.A. al 22% inclusa) l'occorrente spesa a carico del Comune di Cetraro (CS);

RITENUTO che si rende opportuno provvedere all'approvazione della citata perizia tecnica, con l'allegato verbale di somma urgenza, ed al contestuale finanziamento della spesa;

RILEVATO che la copertura finanziaria della spesa di complessivi **€uro 5.294,80** sarà disposta con fondi comunali del Bilancio di Previsione per il triennio 2023-2025, esercizio 2024, con annotazione al capitolo 3396/5, codice 0904202;

DATO ATTO che la spesa di che trattasi non è soggetta ai limiti di cui all'art. 163 c. 5 del T.U.E.L., poiché trattasi di interventi non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

ACQUISITI i pareri resi, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da parte dei Responsabili dell'Area VII e IV in ordine alle regolarità tecnica e contabile sulla proposta deliberativa;

VISTI:

- *il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265 (G.U. n. 227 del 28 settembre 2000, s.o. n. 162/L);*
- *il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36,*

Propone alla Giunta Municipale

1. DI APPROVARE, per tutto quanto in narrativa che qui s'intende integralmente trascritto e riportato, la "Perizia Giustificativa dei Lavori" ed il "Verbale di Somma Urgenza", allegati al presente atto;

2. DI DARE ATTO che la copertura della spesa viene assicurata con le modalità previste dall'articoli 191, comma 3, e 194 comma 1, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni;

3. DI PROVVEDERE, *pertanto*, a sottoporre, la presente proposta deliberativa, al Consiglio Comunale ai fini del riconoscimento della spesa con le modalità previste al citato articolo 194, comma 1, lettera e);

4. DI INTERESSARE i Responsabili dell'Area VII, Settore Manutenzione e Demanio Marittimo e dell'Area IV, Settore Economico-Finanziario per gli adempimenti di propria competenza;

5. DI DICHIARARE la presente Deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs n. 267/2000.



Il Responsabile dell'Area VII

(Ing. Giuseppe CURCIO)



COMUNE DI CETRARO
(Provincia di Cosenza)

INTERVENTI URGENTI ED INDIFFERIBILI POSTI IN ESSERE PER ELIMINARE SITUAZIONI DI POSSIBILE PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ IN CONSEGUENZA DEL DANNEGGIAMENTO DELL'EMISSARIO SOTTOMARINO.

**APPROVAZIONE DEL VERBALE DI SOMMA URGENZA
E DELLA PERIZIA GIUSTIFICATIVA DEI LAVORI**

Su relazione del Vice Sindaco Tommaso CESAREO che riferisce sulla proposta deliberativa del Responsabile dell'AREA VII - Settore Manutenzione e Demanio Marittimo,

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta del Responsabile dell'AREA VII - Settore Manutenzione e Demanio Marittimo, che della presente Deliberazione è parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO che, ai sensi del comma 4 dell'anzidetto art. 140 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, *“Il RUP o altro tecnico dell'amministrazione competente compila una perizia giustificativa delle prestazioni richieste entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione della prestazione affidata. Qualora l'amministrazione competente sia un ente locale, la copertura della spesa è assicurata con le modalità previste dagli articoli 191, comma 3, e 194 comma 1, lettera e), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”*;

RITENUTO, pertanto, opportuno procedere all'approvazione del 'Verbale di Somma Urgenza' e della 'Perizia Giustificativa dei Lavori', redatti entrambi ai sensi del comma 3 dell'anzidetto art. 140 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e contestualmente di disporre la copertura della spesa, risultante dalla Perizia, pari ad €uro 5.294,80;

PRESO ATTO dei Pareri Favorevoli del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale – Area VII - Settore Manutenzione e Demanio Marittimo e del Responsabile dell'Area IV - Settore Economico-Finanziario, resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267;

Con voti unanimi favorevoli resi nei modi di legge;

DELIBERA

- 1. DI ADOTTARE** la proposta del Responsabile dell'Area VII, Settore Manutenzione e Demanio Marittimo, che della presente Deliberazione è parte integrante e sostanziale;
- 2. DI INTERESSARE** il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale – Area VII - Settore Manutenzione e Demanio Marittimo e del Responsabile dell'Area IV° - Settore Economico-Finanziario, per gli adempimenti di propria competenza;
- 3. DI DICHIARARE** la presente Deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs n. 267/2000.



COMUNE DI CETRARO

(Provincia di Cosenza)

Via Luigi De Seta, 54 87022 Cetraro (CS)
tel 0982 978211 - protocollo.cetraro@asmepec.it

VERBALE DI SOMMA URGENZA

(di cui all'art. 140 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,
Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78,
recante delega al Governo in materia di contratti pubblici - G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12)

Oggetto: DISPOSIZIONE DI SERVIZIO PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE OPERATIVE ATTE A FRONTEGGIARE POSSIBILI SITUAZIONI DI PREGIUDIZIO ALLA PUBBLICA INCOLUMITÀ DERIVANTE DALLA ROTTURA DELL'EMISSARIO SOTTOMARINO DEI REFLUI URBANI SCARICATI DAGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE COMUNALI.

L'anno 2024, il giorno 23 del mese di marzo, a seguito della tempestiva segnalazione da parte del Geom. Andrea Caruso, nella veste di amministratore unico dell'Impresa R.M.C. Costruzioni s.r.l., subappaltatrice degli *"Interventi di ripristino e ricarica di opere idraulico-marittime esistenti"* (finanziati con Delibera CIPESS 79 del 22 dicembre 2021 "Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 e 2021-2027"), affidati dal Comune di Cetraro (CS) all'Impresa CAMPANIA NOLEGGI S.r.l. con contratto di appalto del 17/05/2023 (Rep. 5/2023, registrato all'Agenzia delle Entrate Serie 1T, Numero: 9621 del 25/05/2023), alla presenza congiunta dell'Ing. Gianfranco Sbarra, Direttore dei Lavori dell'intervento in corso di esecuzione,

i sottoscritti Ing. Giuseppe Curcio e Ing. Francesco Antonuccio prendono atto della criticità rilevata, che di seguito verrà dettagliatamente descritta, e dispongono nel contempo le misure urgenti ed indifferibili da attivare nel più breve tempo possibile per la sua risoluzione.

Si premette la cronologia delle operazioni svolte fino alla data odierna.

In data 20.03.2024, nel corso dell'esecuzione dei lavori di salpamento di massi in cls (così come previsti nel progetto dei lavori sopra indicati), è stata accidentalmente danneggiata, dall'escavatore in uso, la condotta sottomarina di scarico nel Mar Tirreno dei reflui urbani derivanti dagli impianti di depurazione comunale.

L'emissario sottomarino posto teoricamente (dagli elaborati grafici di progetto depositati agli atti d'ufficio) più a sud, rispetto alla scogliera preesistente ed ai massi da salpare, ovvero ad una batimetrica di circa 3,0 metri e ad una ulteriore profondità di circa 1,5 metri dal fondale



marino (in tutto a - 4,5 metri), è stato, invece, 'squarciato' per una ampiezza di 1.80 metri, ad una profondità di circa 2,50 m, quindi ad una profondità significativamente minore.

La condotta sottomarina è stata, oltretutto, rinvenuta al di sotto di una serie di massi in calcestruzzo.

Si suppone, che, verosimilmente, la circostanza anzidetta, del tutto impreveduta ed imprevedibile, è da ricercarsi dall'evolversi dell'erosione costiera, causata dalle violente mareggiate verificatesi dopo la realizzazione della condotta (avvenuta nel 1982).

Pertanto, mercoledì scorso, sia l'Ing. Gianfranco Sbarra che il Geom. Andrea Caruso, dopo aver comunicato quanto accaduto sia all'Ing. Francesco Antonuccio, Responsabile Unico del Progetto dei lavori sopra indicati, e sia all'Ing. Giuseppe Curcio, Responsabile dell'Area VII – Manutenzione e Demanio Marittimo, hanno predisposto (ognuno per le proprie specifiche competenze e funzioni) tutte le operazioni indispensabili per risolvere tempestivamente la problematica occorsa.

Si è provveduto da subito a contattare sia il primo operatore subacqueo abilitato, disponibile, per stabilire l'entità dei danni alla condotta, che l'impresa di gestione della rete fognaria e dei depuratori comunali.

Nelle successive ore pomeridiane, l'operatore subacqueo rintracciato (il Sig. Sassone Domenico Rosario - Centro Sub Scalea) ha provveduto ad effettuare un primo sopralluogo e le riprese video-fotografiche (che sono già state depositate agli atti d'ufficio ed allegate virtualmente al fascicolo).

In data 21.03.2024, l'operatore subacqueo effettuava una seconda immersione per estrarre un pezzo di condotta danneggiata da cui determinare le sue caratteristiche tecnico - idrauliche (diametro, spessore, pressione nominale ecc...).

Nella stessa fase di immersione è stata stimata la sostituzione del tratto danneggiato con circa 5/6 m di nuova condotta. Dall'analisi del reperto estratto (circa 60 cm – lato terra) si evince che l'emissario sottomarino fu realizzato con una condotta in polietilene del diametro esterno di 225 mm e spessore di 10/11 mm (pressione nominale stimabile in PN 6).

Dopo aver visionato le riprese video, con la consulenza dello stesso Sig. Sassone, si è provveduto ad elaborare una linea d'intervento ed a quantificare una prima stima di tutti i materiali occorrenti per l'intervento di riparazione.

L'impresa esecutrice si attivava, perciò, per la richiesta di preventivi dei materiali e della messa in opera degli stessi. Nelle ore pomeridiane, dello stesso giorno 21/03, all'Impresa Esecutrice sono stati trasmessi:

- a) Il preventivo di spesa del Sig. Sassone per lavori subacquei, consistenti nel drenaggio con sorbona della tratta di condotta interessata, il taglio della condotta in prossimità di sezioni non danneggiate e non ovalizzate, l'installazione di giunti gibault, la posa in opera del tubo nuovo, zavorraggio del nuovo tratto di condotta incluso;
- b) Il preventivo di spesa della Ditta D'Ambrogio Teodoro, per la fornitura di 2 giunti universali antisfilamento, 2 barre da 5 m di tubo in polietilene del diametro 225 e pressione nominale PN 10, manicotto elettrico (mm 225 – PN 10) e saldatura per elettro fusione, la richiesta assistenza tecnica straordinaria.

Il Responsabile Unico del Progetto ed il Direttore dei Lavori, nel prendere atto della circostanza di cui sopra, del tutto imprevedibile ed imprevedibile, hanno reso edotto per vie brevi l'Impresa Esecutrice che l'intervento di che trattasi sarà contabilizzato nell'ambito dei lavori in corso, previa analisi di mercato per la congruità dei prezzi offerti e tenendo in debito conto l'urgenza e la difficoltà nel reperire nell'immediatezza i materiali necessari e gli operatori specializzati per la messa in opera.

In data 22.03.2024, ricevuti i materiali preventivati, alle ore 14.00 iniziano le prime fasi degli operatori subacquei per il drenaggio intorno alla condotta danneggiata, con l'assistenza dell'impresa esecutrice/subappaltatrice (escavatore per salpamento massi che si frappongono e sovrastano la condotta danneggiata, compressore ad aria per azionamento draga a sorbona).

Liberato un primo tratto di condotta integro lato terra, viene effettuato un secondo taglio di circa 60 cm per l'innesto del primo giunto universale.

Nelle successive operazioni di drenaggio e salpamento massi si rivela un secondo tratto danneggiato di condotta verso terra, con perdita visibile a circa 3/4 m dalla linea di battigia che risulta schiacciato in alcuni punti lungo un tratto di circa 4/5 m.

Alle ore 19:10 le operazioni vengono sospese e rinviate al giorno successivo.

Giorno 23.03.2024, alle ore 7:15, ricominciano le operazioni sulla condotta lato mare per liberare un tratto di condotta integro ed effettuare l'innesto dei giunti.

Dopo circa un'ora di drenaggio con sorbona e l'aiuto dell'escavatore, l'operatore subacqueo riferisce che la condotta sottomarina oltre che tranciata, risulta estremamente schiacciata e lesionata longitudinalmente per un altro tratto distante verso mare circa 5,00 metri (rispetto al punto dello squarcio iniziale).

In data odierna 23.03.2024, per quanto sopra appena esposto e considerato, prontamente informati telefonicamente e giunti sul posto nel più breve tempo possibile, i sottoscritti Ing. Giuseppe Curcio e Ing. Francesco Antonuccio, unitamente ai convenuti, accertano quanto segue:

- a) *la lunghezza complessiva del tratto di tubazione da sostituire è di circa 13/14 metri;*
- b) *occorrono, pertanto, almeno un'altra barra di tubazione da 5,0 metri ed un manicotto elettrico da saldare per elettrofusione (a vantaggio di sicurezza si dovrà ordinare un'altra barra di tubo da 5 m ed almeno un altro manicotto elettrico);*
- c) *per l'intervento sull'estremità lato mare, per fornire adeguata assistenza ai sommozzatori, è necessario realizzare un pennello di servizio di almeno 6/8 metri dal quale poter operare con l'escavatore.*

Contestualmente viene appurato, a conferma di quanto supposto inizialmente, che probabilmente la lesione (di tipo longitudinale) sulla condotta nel tratto lato mare (cfr. video 2 e 3), in ragione della distanza di quest'ultima dalla linea di battigia e dal raggio d'azione dell'escavatore nella fase di salpamento dei massi in cls, fosse già presente sulla condotta stessa prima del danneggiamento avvenuto in data 20/03/2024.

Ciò vale anche per i vari punti di schiacciamento del tratto di condotta lato terra ove la stessa si trova frapposta e sovrastata da vecchi massi in cls (cfr. video n. 1).

Questa ipotesi si ritiene congruente col fatto che dopo la realizzazione della condotta sottomarina furono realizzate interventi di difesa costiera in massi di cls, più volte potenziati e ancora presenti sul litorale proprio in corrispondenza della condotta sottomarina.

Nei successivi 40 anni, l'erosione costiera ha determinato un macroscopico arretramento della linea di riva (dal 2010 ad oggi di circa 10 m verso terra) e le mareggiate hanno divelto e conseguentemente ridislocato i massi in cls che probabilmente hanno schiacciato la condotta sottomarina.

Ciò detto, per tutto quanto sopra descritto,

ATTESO che, nella fattispecie, ricorrono i presupposti per l'adozione del presente atto, in considerazione della necessità di prevenire ed eliminare possibili pericoli alla pubblica incolumità e della sussistenza dei requisiti della estrema urgenza;

ASSODATO che, non intervenendo tempestivamente per la risoluzione della problematica in essere, potrebbero verificarsi copiose uscite di reflui in corrispondenza dell'impianto di sollevamento, denominato 'spinta a mare', sito in Località Sottocastello – Cubo;

RICHIAMATO l'art. 140 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in cui, al comma 6, si ribadisce che "*Costituisce circostanza di somma urgenza, ai fini del presente articolo, anche il verificarsi degli eventi di cui all'articolo 7 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, ovvero la ragionevole previsione dell'imminente verificarsi degli stessi, che richiede l'adozione di misure indilazionabili, nei limiti dello stretto necessario*";



DATO ATTO che, ai sensi del comma 3 dell'anzidetto art. 140 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, "Il corrispettivo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo il RUP può ingiungere all'affidatario l'esecuzione di forniture, servizi o lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzi ufficiali di riferimento, ridotti del 20 per cento. I prezzi di cui al primo periodo, se relativi all'esecuzione di lavori, sono comunque ammessi nella contabilità e, se relativi all'acquisizione di forniture e servizi, sono allegati al verbale e sottoscritti dall'operatore economico; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati";

VISTO l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante 'Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali' a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265;

i sottoscritti, **Ing. Giuseppe Curcio**, nella veste di Responsabile dell'Area VII – Settore Manutenzione e Demanio, e **l'Ing. Francesco Antonuccio**, nella veste di Responsabile Unico del Progetto degli "Interventi di ripristino e ricarica di opere idraulico-marittime esistenti", (finanziati con Delibera CIPESS 79 del 22 dicembre 2021 "Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 e 2021-2027"),

DISPONGONO

in capo all'Impresa CAMPANIA NOLEGGI S.r.l. l'immediata esecuzione, condizioni meteomarine favorevoli, dei lavori / interventi strettamente necessari al ripristino della funzionalità idraulica della condotta sottomarina.

Si conviene, in aggiunta, quanto segue:

- I prezzi delle prestazioni da eseguirsi sono definiti consensualmente dalle parti in ragione dei correnti prezzi di mercato, ponendoli, ai sensi del comma 4 dell'art. 140 del D.lgs. 36/2023, a base della Perizia Giustificativa dei Lavori, la cui copertura della spesa verrà assicurata in parte nell'ambito delle risorse disponibili alla voce 'imprevisti' di cui al quadro economico rimodulato dell'appalto "Interventi di ripristino e ricarica di opere idraulico-marittime esistenti" (finanziati con Delibera CIPESS 79 del 22 dicembre 2021 "Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 e 2021-2027"), ed in parte con fondi comunali da reperire con le modalità previste dall'articoli 191, comma 3, e 194 comma 1, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni;
- All'Ing. Gianfranco Sbarra viene demandato il compito di supervisionare la corretta esecuzione dei lavori di che trattasi, ovverosia di approntarne la contabilità separata (tra i

- lavori la cui spesa sarà a carico del Comune ed i lavori da spendere nell'ambito del finanziamento regionale accordato);
- La Ditta Esecutrice dichiara che i prezzi come sopra concordati, tenuto conto della complessità e dell'urgenza dell'intervento, delle condizioni di esecuzione, nonché di ogni qualsivoglia onere a totale carico della stessa, per l'approntamento delle misure di sicurezza delle maestranze e di terzi, garantiscono l'esecuzione dei lavori a regola d'arte;
 - All'Ing. Francesco Antonuccio è affidato il compito di rendicontare i lavori eseguiti nella Perizia Giustificativa di Spesa che verrà trasmessa, unitamente al presente verbale di somma urgenza, alla Giunta Comunale che provvederà alla copertura della spesa ed all'approvazione dei lavori.

In relazione alla redazione del presente verbale, la Ditta Affidataria dichiara:

- di avere tutti i requisiti di Legge per l'esecuzione dei lavori;
- di avere la polizza di Responsabilità Civile;
- che il Direttore Tecnico di Cantiere è lo stesso titolare firmatario del presente Verbale.

Letto, confermato e sottoscritto

Ing. Giuseppe Curcio

Ing. Francesco Antonuccio

Ing. Gianfranco Sbarra


Il presente verbale, in unica copia originale da custodirsi nella Residenza Municipale, c/o l'Ufficio Tecnico Comunale – Area VII - Settore Manutenzione e Demanio Marittimo, dopo essere stato letto, confermato in tutte le sue parti, viene sottoscritto per accettazione dalla Impresa Esecutrice di cui sopra, nella persona del Geom. Andrea Caruso.

Impresa CAMPANIA NOLEGGI S.r.l.

CAMPANIA NOLEGGI S.R.L.

Il Procuratore Speciale

Geom. Andrea Caruso



Cetraro (CS), li 23 marzo 2024



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



(Foto del 20/03/2024)




(Foto del 20/03/2024)







(Foto del 21/03/2024)



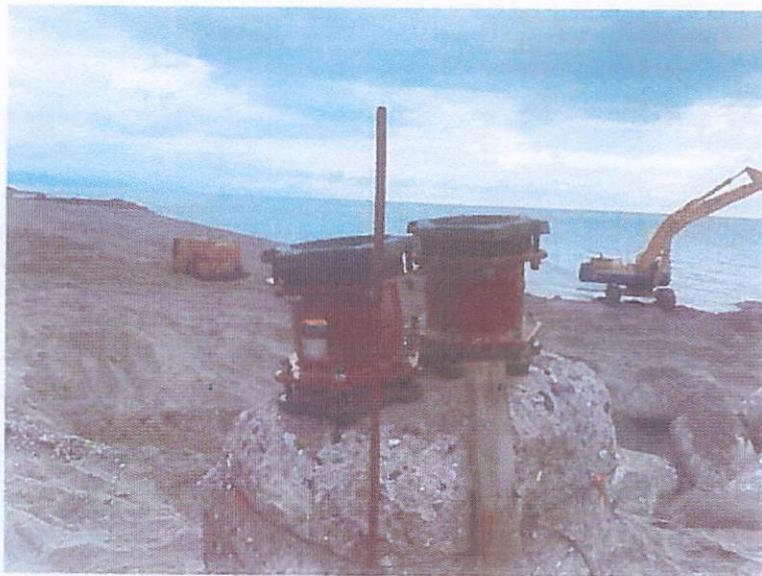

(Foto del 22.03.2024)



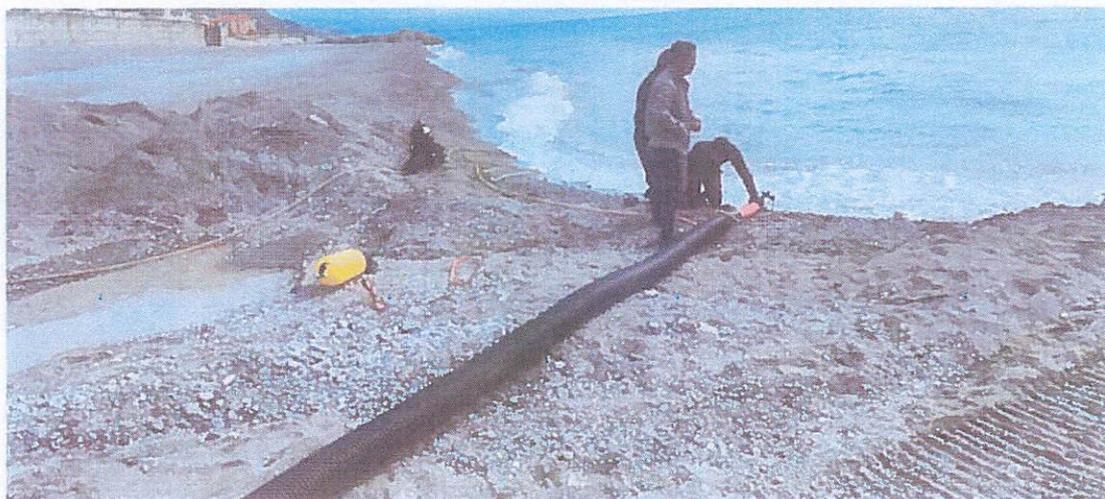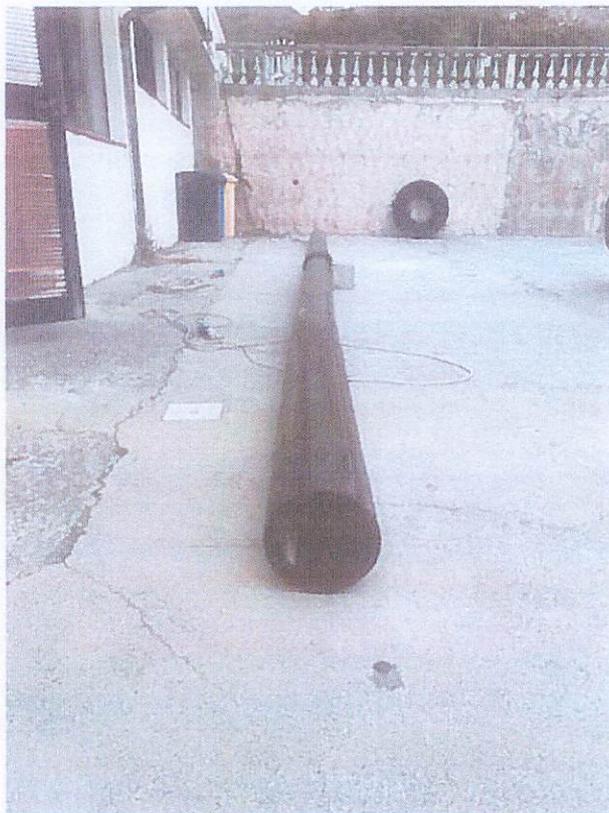

(Foto del 22/03/2024)



(Foto - video del 23.03.2024)



**COMUNE DI CETRARO
PROVINCIA DI COSENZA**

Oggetto: ATTUAZIONE DELLE MISURE OPERATIVE ATTE A FRONTEGGIARE POSSIBILI SITUAZIONI DI PREGIUDIZIO ALLA PUBBLICA INCOLUMITÀ DERIVANTE DALLA ROTTURA DELL'EMISSARIO SOTTOMARINO DEI REFLUI URBANI SCARICATI DAGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE COMUNALI

PERIZIA DI STIMA DEI LAVORI

In relazione a quanto disposto con Verbale di Somma Urgenza del 23.03.2024, circa le disposizioni di servizio di cui in oggetto il sottoscritto ing. Gianfranco Sbarra, in qualità di Direttore dei Lavori degli *"INTERVENTI DI RIPRISTINO E RICARICA DI OPERE IDRAULICO-MARITTIME ESISTENTI"* CUP: I35F21000730002 - CIG: 9517566FE9, a cui è stato, inoltre, demandato il compito di supervisionare la corretta esecuzione dei lavori di che trattasi, ovverosia di approntarne la contabilità separata tra i lavori la cui spesa sarà a carico del Comune ed i lavori da spendere nell'ambito del finanziamento regionale accordato,

- Visti i preventivi di spesa già acclarati agli atti dell'impresa esecutrice circa:

1. I lavori subacquei consistenti nel: drenaggio con *sorbona* della tratta di condotta interessata, taglio della condotta in prossimità di sezioni non danneggiate e non ovalizzate, installazione di giunti *gibault*, posa in opera di tubo nuovo, zavorraggio del nuovo tratto di condotta (preventivo (sig. Sassone Domenico Rosario - Centro Sub Scalea);
2. la fornitura di: 2 giunti universali antisfilamento, 2 barre da 5 m di tubo in polietilene del diametro 225 e pressione nominale PN 10, manicotto elettrico (mm 225 – PN 10) e saldatura per elettrofusione (preventivo della D'Ambrogio Teodoro, già impresa di gestione della rete fognaria del Comune di Cetraro);
3. l'assistenza notturna per le operazioni di riparazione condotta sottomarina, con l'ausilio di ns. squadra tecnica, autospurgo, mezzi e attrezzatura (Impresa: D'Ambrogio Teodoro);
4. l'ulteriore fornitura di: 2 barre da 5 m di tubo in polietilene del diametro 225 e pressione nominale PN 10, 2 manicotti elettrici (mm 225 – PN 10) e 2 saldature per elettrofusione (Impresa: D'Ambrogio Teodoro);
5. l'assistenza per le operazioni di riparazione condotta sottomarina, con l'ausilio di ns. squadra tecnica, escavatore, compressore aria e attrezzatura (Impresa: CAMPANIA NOLEGGI SRL - RMC SRL);
6. la fornitura e la posa in opera di zavorre in cls armato delle dimensioni di 1,50x1,00x1,00 m costituite da: - Casseforme rette incluso la sagomatura di un canale di alloggiamento della condotta sottomarina, dimensioni 0,50x0,50x1,00 m; fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, in ragione di circa 40 kg per ogni zavorra; - n. 2 ganci di dislocamento in barre di acciaio diametro non inferiore a 16 mm; - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente aggressivo esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare e in contatto diretto con l'acqua di mare, classe di resistenza caratteristica C35/45; Tutto incluso il

sollevamento e l'avvicinamento sul sito di intervento con mezzo meccanico. (Impresa: CAMPANIA NOLEGGI SRL - RMC SRL);

7. la realizzazione di un pennello di servizio per l'assistenza alle operazioni subacquee mediante salpamento subacqueo di scogli naturali con mezzo terrestre.
- Appurato, come da Verbale di Somma Urgenza del 23.03.2024 - del Comune di Cetraro, che sulla condotta sottomarina fossero già presenti dei danni prima del danneggiamento avvenuto in data 20/03/2024 come emerso dalle operazioni e rilievi videofotografici effettuati dagli operatori subacquei in data 23.03.2024.
 - Avvertita, inoltre, l'impresa esecutrice che tutti i preventivi sopra citati, saranno messi in contabilità lavori giusta analisi di mercato per la congruità dei prezzi offerti, tenendo conto dell'urgenza e della difficoltà nel reperire nell'immediatezza e nella provincia i materiali necessari e gli operatori specializzati per la messa in opera;

Rimette la presente stima del costo per i lavori di riparazione della condotta sottomarina, come sinteticamente riportato nella successiva tabella e analiticamente quantificato nel computo metrico allegato, distinta in contabilità separata tra la spesa a carico del Comune e quella a carico dell'Impresa Esecutrice nell'ambito del finanziamento regionale accordato (CUP: I35F21000730002 – CIG: 9517566FE9);

DESCRIZIONE	COSTO	IVA	TOTALE SPESE
<i>RIPRISTINO CONDOTTA SOTTOMARINA DANNEGGIATA PER CAUSE IMPREVISTE ED IMPREVEDIBILI NELL'AMBITO DEGLI "INTERVENTI DI RIPRISTINO E RICARICA DI OPERE IDRAULICO-MARITTIME ESISTENTI" CUP: I35F21000730002 - CIG: 9517566FE9 A CARICO DELL'IMPRESA</i>	22.191,66 €	22,00%	27.073,83 €
<i>RIPRISTINO CONDOTTA SOTTOMARINA GLA' DANNEGGIATA A CARICO DEL COMUNE</i>	4.340,00 €	22,00%	5.294,80 €
TOTALE	26.531,66 €		32.368,63 €

Il sottoscritto, inoltre, sottolinea che la presente perizia è una stima dei costi relativi alle lavorazioni preventivate secondo le situazioni accertate e documentate fino al 23.03.2024, e non tiene conto di eventuali imprevisti che potrebbero verificarsi nel corso delle lavorazioni stesse.

In allegato, Computo Metrico Estimativo.

Cetraro, li 03.04.2024



Ing. Gianfranco Sbarra

Comune di Cetraro
Provincia di Cosenza

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: ATTUAZIONE DELLE MISURE OPERATIVE ATTE A FRONTEGGIARE POSSIBILI SITUAZIONI DI PREGIUDIZIO ALLA PUBBLICA INCOLUMITÀ DERIVANTE DALLA ROTTURA DELL'EMISSARIO SOTTOMARINO DEI REFLUI URBANI SCARICATI DAGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE COMUNALI.

COMMITTENTE: Comune di Cetraro

Data, 03/04/2024



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gianfranco Sbarra', positioned below the professional stamp.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 PRV 1 - 21.03.2024 03/04/2024	<p>RIPRISTINO CONDOTTA SOTTOMARINA DANNEGGIATA PER CAUSE IMPREVISTE ED IMPREVEDIBILI NELL'AMBITO DEGLI "INTERVENTI DI RIPRISTINO E RICARICA DI OPERE IDRAULICO-MARITTIME ESISTENTI" CUP: I35F21000730002 - CIG: 9517566FE9 A CARICO DELL'IMPRESA (Cat 1)</p> <p>FORNITURA DI: 2 giunti universali antisfilamento, 2 barre da 5 m di tubo in polietilene del diametro 225 e pressione nominale PN 10, manicotto elettrico (mm 225 – PN 10) e saldatura per elettrofusione. (Impresa: D'Ambrogio Teodoro) PRIMA FORNITURA DEI MATERIALI DA PRIMA STIMA DEI DANNI - A CARICO DELL'IMPRESA</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO a corpo</p>					1,00		
						1,00	3'650,00	3'650,00
2 PRV 1ter- 21.03.2024 03/04/2024	<p>RIPRISTINO CONDOTTA SOTTOMARINA GIA' DANNEGGIATA A CARICO DEL COMUNE (Cat 2)</p> <p>ULTERIORE FORNITURA DI: 2 barre da 5 m di tubo in polietilene del diametro 225 e pressione nominale PN 10, 2 manicotti elettrici (mm 225 – PN 10) e 2 saldature per elettrofusione. (Impresa: D'Ambrogio Teodoro) SECONDA FORNITURA PREVISTA DOPO ACCERTAMENTO ULTERIORI DANNI GIA' ESTISTENTI SULLA CONDOTTA - A CARICO DEL COMUNE</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO a corpo</p>					1,00		
						1,00	2'300,00	2'300,00
3 PRV 1bis- 21.03.2024 03/04/2024	<p>RIPRISTINO CONDOTTA SOTTOMARINA DANNEGGIATA PER CAUSE IMPREVISTE ED IMPREVEDIBILI NELL'AMBITO DEGLI "INTERVENTI DI RIPRISTINO E RICARICA DI OPERE IDRAULICO-MARITTIME ESISTENTI" CUP: I35F21000730002 - CIG: 9517566FE9 A CARICO DELL'IMPRESA (Cat 1)</p> <p>ASSISTENZA NOTTURNA per le operazioni di riparazione condotta sottomarina, con l'ausilio di ns. squadra tecnica, autospurgo, mezzi e attrezzatura (Impresa: D'Ambrogio Teodoro) PERCENTUALE A CARICO DELL'IMPRESA ESECUTRICE - ACARICO DELL'IMPRESA</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO a corpo</p>					1,00		
						1,00	3'500,00	3'500,00
4 PRV 4 - 02.04.2024 03/04/2024	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI ZAVORRE IN CLS ARMATO delle dimensioni di 1,50x1,00x1,00 m costituite da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Casseforme rette incluso la sagomatura di un canale di alloggiamento della condotta sottomarina, dimensioni 0,50x0,50x1,00 m; - Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, in ragione di circa 40 kg per ogni zavorra; - n. 2 ganci di dislocamento in barre di acciaio diametro non inferiore a 16 mm; - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente aggressivo esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare e in 							
	A R I P O R T A R E							9'450,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							9'450,00
	<p>contatto diretto con l'acqua di mare, classe di resistenza caratteristica C35/45; Tutto incluso il sollevamento e l'avvicinamento sul sito di intervento con mezzo meccanico. ZAVORRA IN MASSI DI CLS - A CARICO DELL'IMPRESA</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cadauno</p>					5,00		
						5,00	737,00	3'685,00
5 22CL.PR.U.0 01020.010.a 03/04/2024	<p>SALPAMENTO DI SCGLI Salpamento subacqueo di scogli naturali o massi artificiali in conglomerato cementizio, anche insabbiati, fino ad una profondità di 6 m. sotto il livello medio del mare, da eseguirsi con l'ausilio degli idonei mezzi e del palombaro, compreso l'onere del trasporto e collocazione in opera in sagoma di scogliera nell'ambito del cantiere e nei siti indicati dalla D.L., o il carico, il trasporto a rifiuto entro 10 km dal punto di raccolta compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte Eseguito con mezzi terrestri REALIZZAZIONE PENNELLO DI SEVIZIO PER ASSISTENZA LAVORI SUBAQUEI CON ESCAVATORE - A CARICO DELL'IMPRESA *(larg.=(10+4,50)/2)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		10,00	7,250	1,500	108,75		
						108,75	38,59	4'196,66
6 PRV 2 - 20.03.2024 03/04/2024	<p>Lavori sottomarini suddivisi nelle seguenti fasi: 1) pulizia tubi con draga a sorbona 2gg; 2) attestaggio tubi rotti 1 gg; 3) installazione giunti tipo gibault, 1 gg; 4) posa in opera tubo nuovo 1 gg; 5) posa massi (zavorre) su tubo 1gg. (Impresa: Sassone Domenico) PERCENTUALE A CARICO DELL'IMPRESA</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO a corpo</p>					0,70		
						0,70	6'800,00	4'760,00
	RIPRISTINO CONDOTTA SOTTOMARINA GIA' DANNEGGIATA A CARICO DEL COMUNE (Cat 2)							
7 PRV 2 - 20.03.2024 03/04/2024	<p>Lavori sottomarini suddivisi nelle seguenti fasi: 1) pulizia tubi con draga a sorbona 2gg; 2) attestaggio tubi rotti 1 gg; 3) installazione giunti tipo gibault, 1 gg; 4) posa in opera tubo nuovo 1 gg; 5) posa massi (zavorre) su tubo 1gg. (Impresa: Sassone Domenico) PERCENTUALE A CARICO DEL COMUNE</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO a corpo</p>					0,30		
						0,30	6'800,00	2'040,00
	RIPRISTINO CONDOTTA SOTTOMARINA DANNEGGIATA PER CAUSE IMPREVISTE ED IMPREVEDIBILI NELL'AMBITO DEGLI "INTERVENTI DI RIPRISTINO E RICARICA DI OPERE IDRAULICO-MARITTIME ESISTENTI" CUP: I35F21000730002 - CIG: 9517566FE9 A CARICO DELL'IMPRESA (Cat 1)							
8 PRV 3 - 02.04.2024 03/04/2024	<p>ASSISTENZA per le operazioni subacquee di riparazione condotta sottomarina, con l'ausilio di ns. squadra tecnica, escavatore, compressore aria e attrezzatura (Impresa: CAMPANIA NOLEGGI SRL - RMC SRL) A CARICO DELL'IMPRESA</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO giorni</p>					2,00		
						2,00	1'200,00	2'400,00
	A RIPORTARE							26'531,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							26'531,66
	Parziale LAVORI A MISURA euro							26'531,66
	TOTALE euro							26'531,66
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
	<u>Riepilogo Strutturale CATEGORIE</u>	
M	LAVORI A MISURA euro	26'531,66
M:001	ATTUAZIONE DELLE MISURE OPERATIVE ATTE A FRONTEGGIARE POSSIBILI SITUAZIONI DI PREGIUDIZIO ALLA PUBBLICA INCOLUMITÀ DERIVANTE DALLA ROTTURA DELL'EMISSARIO SOTTOMARINO DEI REFLUI URBANI SCARICATI DAGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE COMUNALI. ATTE A FRONTEGGIARE POSSIBILI SITUAZIONI DI PREGIUDIZIO ALLA PUBBLICA INCOLUMITÀ DERIVANTE DALLA ROTTURA DELL'EMISSARIO SOTTOMARINO DEI REFLUI URBANI SCARICATI DAGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE COMUNALI. euro	26'531,66
M:001.001	RIPRISTINO CONDOTTA SOTTOMARINA DANNEGGIATA PER CAUSE IMPREVISTE ED IMPREVEDIBILI NELL'AMBITO DEGLI "INTERVENTI DI RIPRISTINO E RICARICA DI OPERE IDRAULICO-MARITTIME ESISTENTI" CUP: I35F21000730002 - CIG: 9517566FE9 A CARICO DELL'IMPRESA euro	22'191,66
M:001.002	RIPRISTINO CONDOTTA SOTTOMARINA GIA' DANNEGGIATA A CARICO DEL COMUNE euro	4'340,00
	TOTALE euro	26'531,66
	Data, 03/04/2024	
		
	A RIPORTARE	

Del G.C. n. 31

del 17/04/2024

INTERVENTI URGENTI ED INDIFFERIBILI POSTI IN ESSERE PER ELIMINARE SITUAZIONI DI POSSIBILE PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ IN CONSEGUENZA DEL DANNEGGIAMENTO DELL'EMISSARIO SOTTOMARINO.

**APPROVAZIONE DEL VERBALE DI SOMMA URGENZA
E DELLA PERIZIA GIUSTIFICATIVA DEI LAVORI**

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
(art. 49, 1° comma, T.U.E.L. approvato con D.lgs. 18.08.2000 n. 267)

Parere per la regolarità tecnica

Si esprime parere:

Data 17/04/2024

Il Responsabile dell'Area VII
Ing. Giuseppe CURCIO

Parere per la regolarità contabile

Si esprime parere: Data 17/04/2024

RESP. DELL'AREA IV
GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
Dr.ssa Gabriella Scavella

- Che ai sensi dell'art. 153, c. 5 del D.l.s. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive degli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, c. 1 del D.lgs. 267/2000, e con le regole di finanza pubblica e del patto di Stabilità 2015;

Visto

IL RESP. DELL'AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL SEGRETARIO

Dr. Dario Policicchio

IL VICE SINDACO

Tommaso CESAREO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

N. _____ del Reg. delle Pubbl.

Il presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio Comunale il 19/04/2024 e per 15 giorni consecutivi.

Li, 19/04/2024

Si dà atto che dell'adozione della presente deliberazione è stata data comunicazione ai capigruppo consiliari, oggi 19/04/2024..... giorno di pubblicazione, tramite invio di apposito elenco ai sensi dell'art. 125 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.

Il Responsabile della pubblicazione
Barbara Longo

Informativa art. 35, comma 1, lett. H, Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33:

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

N°	COMPONENTI	FIRME
1	Ermanno CENNAMO - Sindaco	Assente
2	Tommaso CESAREO - Vice Sindaco	
3	Barbara FALBO - Assessore	
4	Francesco LANZA - Assessore	
5	Laura LOSARDO - Assessore	
6	Carmen MARTILOTTA - Assessore	
